


UREĐENJE JUŽNE STRANE GROBLJA

(Trenutni istanje)


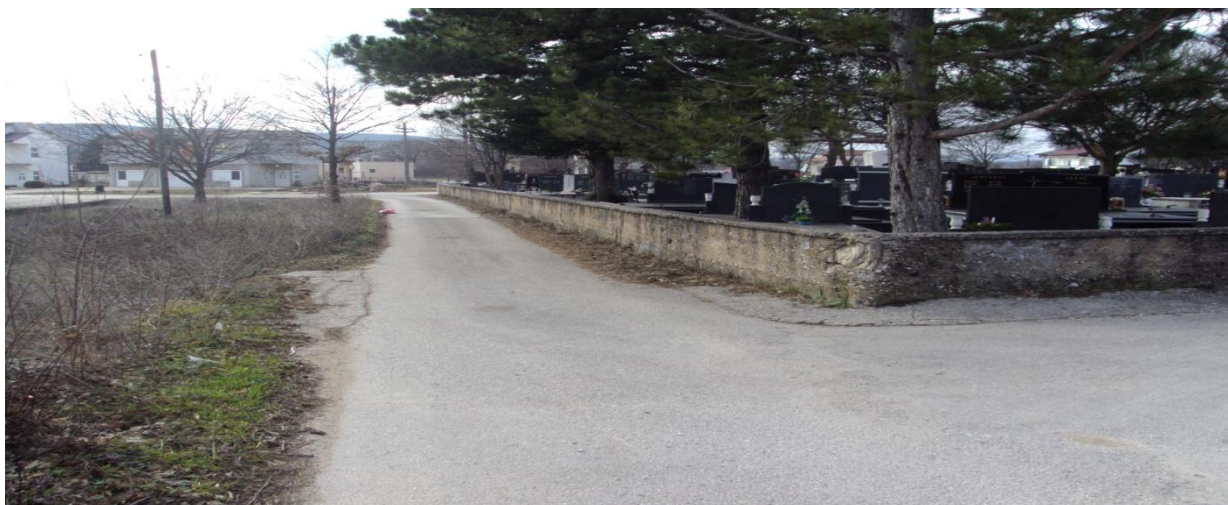


(Planirani budući izgled)

Opcija 1. – Bez proširenja na susjednu parcelu

Dužina = 52 M , Prosječna visina = 0,9 - 1 m

OKOMITA SKICA PLANIRANIH ZAHVATA NA JUŽNOM DIJELU GROBLJA

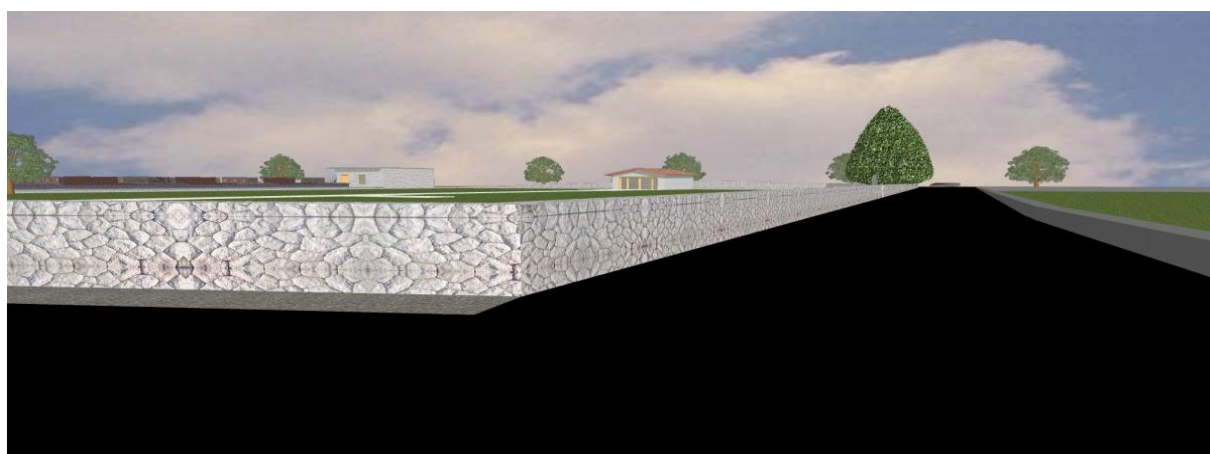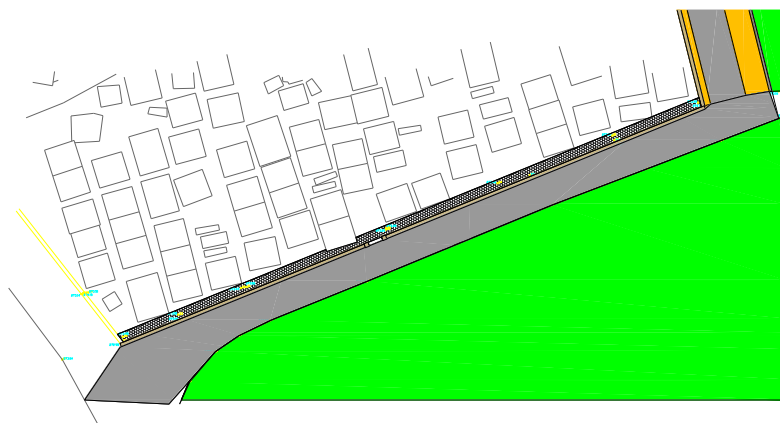



PLANIRANI ZAHVATI:

1. Rušenje i odvoz starog zida
2. Iskop i izrada AB temelja
3. Izgradnja novog zida od groblja :
 - dimenzije zida: širina = 30 cm. prosječna visina = 90-100 cm i dužina =52 m
 - materijal za izradu = beton + prirodni kamen „Osoje „
 - način izrade = vanjska strana od kamena klesanog po sistemu CIKLOP , unutarnja strana od tehno betona i poklopljeno klesanim kamenom debljine 6 cm.
4. Izgradnja staze od kamena uz unutarnju stranu zida u širini od 0,8 m
5. Uređenje bočnog ulaza i postavljanje kapije u širini od 1,2 m

PREDMJER PLANIRANIH ZAHVATA IZNOSI cca 20 000 KM

Opcija 2. –Sa proširenjem na susjednu parcelu

OKOMITA SKICA PLANIRANIH ZAHVATA NA JUŽNOM DIJELU GROBLJA

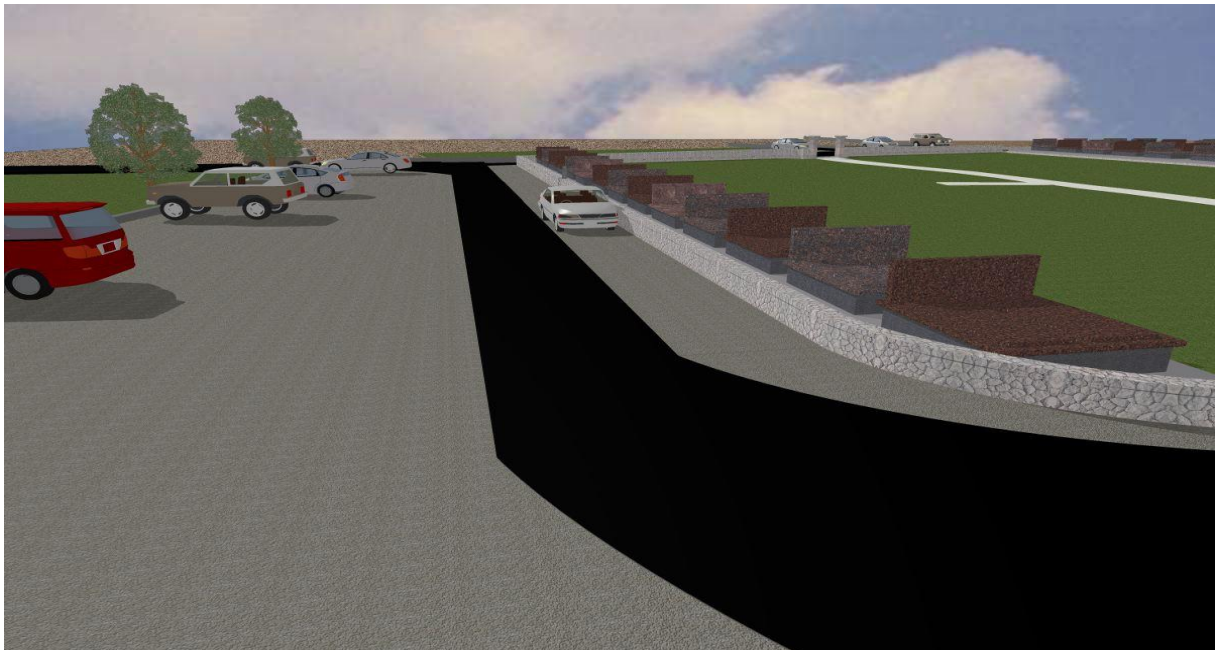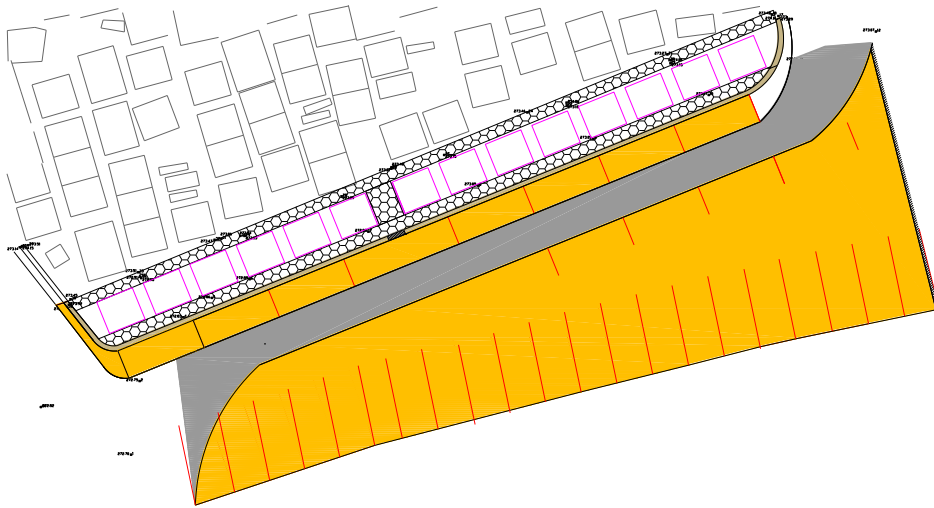

PLANIRANI ZAHVATI:

- 1 Rušenje i odvoz starog zida
2. Iskop i izgradnja 14 novih grobnih mjesta.
3. Izgradnja novog zida od groblja :
 - iskop i izrada AB temelja
 - dimenzije zida: širina = 30 cm. prosječna visina = 90-100 cm i dužina =52 m
 - materijal za izradu = beton + prirodni kamen „Osoje „

- način izrade = vanjska strana od kamena klesanog po sistemu CIKLOP , unutarnja strana od tehno betona i poklopljeno klesanim kamenom debljine 6 cm.
- 4. Izgradnja staze od kamena ili flaster kocke uz unutarnju stranu zida u širini od 0,8 m
- 5. Uređenje bočnog ulaza i postavljanje kapije u širini od 1,2 m
- 6. Izmještanje i asfaltiranje puta širine 3m
- 7. Uređenje parkinga uza zid i ostatku parcele

PLAN RJEŠAVANJA FINACIJSKE KONSTRUKCIJE PLANIRANOG PROJEKTA:

- kupovinu zemljišta i izgradnju grobnih mjesta ukalkulirati u cijenu grobnica
- ostale troškove raspodijeliti na sve članove podjednako
